

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

**МУП "Троицкая электросеть"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**Е 1.1.1.2016**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.**

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте

| № пп | Наименование   | Содержание                                 |
|------|--|--|
| 1    | 2  | 3  |
| 1    | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы  | Техническое перевооружение и реконструкция |
| 2    | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ____)  | Замена ячеек в РУ-10 кВ в ТП-501           |
| 3    | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)   | не применимо                               |
| 4    | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект  | город Москва                               |
| 5    | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект  | г.о. Троицк                                |
| 6    | Наличие решения о резервировании земель  | не требуется                               |
| 7    | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд   | не требуется                               |
| 8    | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую   | не требуется                               |
| 9    | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок   | не требуется                               |
| 10   | Наличие утвержденной документации по планировке территории   | не требуется                               |
| 11   | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования  | нет  |
| 12   | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)   | нет  |
| 13   | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта   | не требуется                               |
| 14   | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации  | не требуется                               |
| 15   | Наличие утвержденной проектной документации  | не требуется                               |
| 16   | Наличие разрешения на строительство  | не требуется                               |
| 17   | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2  | 10 шт.                                     |
| 18   | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации)   | нет  |
| 19   | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации   | нет  |
| 20   | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется                               |
| 21   | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)  | не требуется                               |
| 22   | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации   | не требуется                               |
| 23   | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом  | не требуется                               |
| 24   | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)  | 1,268                                      |
| 25   | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)  |  |



Приложение №  
к приказу Минэнерго России  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. №\_\_

Год раскрытия информации: 2017 год

**Паспорт инвестиционного проекта**

**МУП "Троицкая электросеть"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**Ф 1.1.1.2016**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.**

(наименование инвестиционного проекта)

**Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта**

| № пп | Диспетчерское наименование трансформаторной или иной подстанции |        | Вид оборудования      | Тип оборудования |         | Диспетчерское наименование оборудования |                 | Год выпуска |       | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |       | Номинальная мощность, МВ·А, Мвар |       | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО)  |   | Техническое обследование (далее - ТОБ)                          |  |
|------|---|--------|-----------------------|------------------|---------|---|-----------------|-------------|-------|--------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---|---|---|---|--|
|      | До  | После  |                       | До               | После   | До                                      | После           | До          | После |                          | До                                  | После | До                               | После |   | До  | После   | До  | После  |
| 1    | 2   | 3      | 4                     | 5                | 6       | 7                                       | 8               | 9           | 10    | 11                       | 12                                  | 13    | 14                               | 15    | 16  | 17  | 18  | 19  | 20   |
| 1    | ТП-501  | ТП-501 | Высоковольтные ячейки | КСО-366, КСО-266 | КСО-393 | РУ-10 кВ ТП-501                         | РУ-10 кВ ТП-501 | 1977        | 2016  | 1977                     | 10                                  | 10    | н.д.                             | н.д.  | 2011  | Акт б/н от 05.03.2015г., МУП "Троицкая электросеть", ООО "ТСГ-ТРЕЙД", МТУ Ростехнадзора | Электроустановка в технически исправном состоянии, но требует реконструкции | Акт обследования б/н от 16.01.2015г. МУП "Троицкая электросеть" | Замена камер КСО-366 и КСО-266 на камеры КСО-393 повысит надежность электроснабжения и безопасность обслуживания оборудования. |

Примечание.

При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:

Выключатель  
Автотрансформатор масляный  
Автотрансформатор элегазовый  
Трансформатор силовой масляный  
Трансформатор силовой элегазовый  
Генераторное оборудование  
Синхронный компенсатор  
Батарея статических конденсаторов  
Реактор шунтирующий  
Реактор токоограничивающий



Год раскрытия информации: 2017 год

**Паспорт инвестиционного проекта**

**МУП "Троицкая электросеть"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**Е 1.1.1.2016**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.**

(наименование инвестиционного проекта)

**Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта**

| № пп | Наименование   | Содержание  |
|------|--|---|
| 1    | 2  | 3   |
| 1    | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта  | Целью данного проекта является замена морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-10кВ ТП-501 (в эксплуатации с 1978 года) с ячейками КСО-366 с выключателями нагрузки и КСО-266 с масляным выключателем на камеры КСО-393А с выключателями нагрузки.  |
| 2    | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта   | Реализация данного проекта позволит сократить расходы на техническое обслуживание оборудования, повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжения социально-значимых объектов (ЦТП, станции катодной защиты), а также многоэтажных жилых домов микрорайона «Б».  |
| 3    | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | В РУ-10 кВ ТП-501 производится замена ячеек КСО-366 - 9 шт. с выключателями нагрузки ВН-10/400 и КСО-266 – 1 шт с масляным выключателем ВМГ-10, на ячейки КСО-393 - 10 шт. с выключателями нагрузки ВНА-10/630.   |
| 4    | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта   | н.д.  |
| 5    | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта   | н.д.  |
| 6    | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта   | Поскольку в РУ-10 кВ ТП-501 установлено разноплановое оборудование, имеющее разные временные интервалы технического обслуживания и свою специфику производства переключений. Из-за установленной ячейки КСО-266, имеющей большие габариты чем КСО-366, ширина коридора обслуживания в ТП составляет 1 метр, что не соответствует требованиям пункта 4.2.90. Правил устройства электроустановок. |
| 7    | Год начала реализации инвестиционного проекта  | 2016  |
| 8    | Год окончания реализации инвестиционного проекта   | 2016  |
| 9    | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта  | 3   |





Год раскрытия информации: 2017 год

**Паспорт инвестиционного проекта**

**МУП "Троицкая электросеть"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**F 1.1.1.2016**


(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.**

(наименование инвестиционного проекта)

**Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта**

| Исходные данные  | Значение |     |     |     |
|--|----------|-----|-----|-----|
| Общая стоимость объекта, руб. без НДС  |          |     |     |     |
| Прочие расходы, руб. без НДС на объект   |          |     |     |     |
| Срок амортизации, лет  |          |     |     |     |
| Кол-во объектов, ед.   |          |     |     |     |
| Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС  |          |     |     |     |
| Первый ремонт объекта, лет после постройки   |          |     |     |     |
| Периодичность ремонта объекта, лет   |          |     |     |     |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС  |          |     |     |     |
| Возникновение прочих расходов, лет после постройки   |          |     |     |     |
| Периодичность расходов, лет  |          |     |     |     |
| Налог на прибыль   |          |     |     |     |
| Прочие расходы, руб. без НДС в месяц   |          |     |     |     |
| Рабочий капитал в % от выручки   |          |     |     |     |
| Срок кредита   |          |     |     |     |
| Ставка по кредиту  |          |     |     |     |
| Ставка по кредиту без учета субсидирования   |          |     |     |     |
| Доля заемных средств   |          |     |     |     |
| Ставка дисконтирования на собственный капитал  |          |     |     |     |
| Доля собственных средств   |          |     |     |     |
| Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)   |          |     |     |     |
| Период   | N        | N-1 | N-2 | N-3 |
| Прогноз инфляции   |          |     |     |     |
| Кумулятивная инфляция  |          |     |     |     |
| Доход, руб. без НДС  |          |     |     |     |
| <b>Кредит, руб.</b>  | N        | N-1 | N-2 | N-3 |
| Основной долг на начало периода  |          |     |     |     |
| Поступление кредита  |          |     |     |     |
| Погашение основного долга  |          |     |     |     |
| Начисление процентов   |          |     |     |     |
| <b>Бюджет доходов и расходов, руб.</b>   | N        | N-1 | N-2 | N-3 |
| Доход  |          |     |     |     |
| Операционные расходы   |          |     |     |     |
| Ремонт объекта   |          |     |     |     |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС  |          |     |     |     |
| Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)  |          |     |     |     |
| <b>Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (ЕВИТДА)</b> |          |     |     |     |
| Амортизация  | 0        |     |     |     |
| <b>Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)</b>                             |          |     |     |     |
| Проценты   |          |     |     |     |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>  |          |     |     |     |
| Налог на прибыль   |          |     |     |     |
| <b>Чистая прибыль</b>  |          |     |     |     |
| <b>Денежный поток на собственный капитал, руб.</b>   | N        | N-1 | N-2 | N-3 |
| <b>Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)</b>                             |          |     |     |     |
| Амортизация  |          |     |     |     |
| Проценты   |          |     |     |     |
| Налог на прибыль   |          |     |     |     |
| НДС  |          |     |     |     |
| Изменения в рабочем капитале   |          |     |     |     |
| Инвестиции   |          |     |     |     |
| Изменения финансовых обязательств  |          |     |     |     |
| <b>Чистый денежный поток</b>   |          |     |     |     |
| <b>Накопленный чистый денежный поток</b>   |          |     |     |     |
| Коэффициент дисконтирования  |          |     |     |     |
| <b>Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)</b>                                     |          |     |     |     |
| <b>Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)</b>  |          |     |     |     |
| <b>Внутренняя норма доходности (IRR)</b>   |          |     |     |     |
| <b>Срок окупаемости (PBP)</b>  |          |     |     |     |
| <b>Дисконтированный срок окупаемости (DBP)</b>   |          |     |     |     |

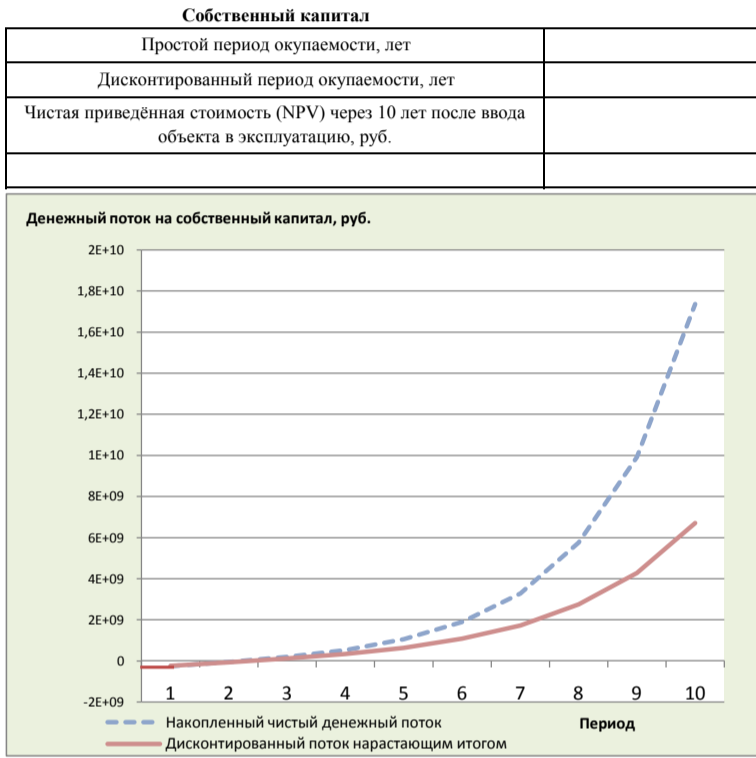

\* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

\*\* Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию



Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

**МУП "Троицкая электросеть"**  
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**Е 1.1.1.2016**  
(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.**  
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта

| №        | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *  | Сроки выполнения |                  |   |                  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания |
|----------|--|------------------|------------------|---|------------------|---|---|-------------------------------|---|
|          |  | План             |                  | Факт (предложения по корректировке плана) |                  |   |   |                               |   |
|          |  | начало (дата)    | окончание (дата) | начало (дата)                             | окончание (дата) |   |   |                               |   |
| 1        | 2  | 3                | 4                | 7   | 8                | 9   | 10  | 11                            | 12  |
| <b>1</b> | <b>Предпроектный и проектный этап</b>  |                  |                  |   |                  |   |   |                               |   |
| 1.1.     | Заключение договора на ТП  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.2.     | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту   | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.2.1.   | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории   | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.3.     | Утверждение документации по планировке территории  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.4.     | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок   | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.5.     | Заключение договора на разработку проектной документации   | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.6.     | Приемка проектной документации заказчиком  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.7.     | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.8.     | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.9.     | Утверждение проектной документации   | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.10.    | Получение разрешения на строительство  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 1.11.    | Разработка рабочей документации  | янв.16           | мар.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 1.12.    | <b>Организационный этап</b>  |                  |                  | н.д.                                      | н.д.             |   |   |                               |   |
| 2        | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)  | мар.16           | мар.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 2.1.     | Закупка основного оборудования   | апр.16           | июн.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 2.2.     | <b>Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ</b>  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 3        | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 3.1.     | Поставка основного оборудования  | апр.16           | июн.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 3.2.     | Монтаж основного оборудования  | июл.16           | сен.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 3.3.     | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 3.4.     | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 3.5.     | Пусконаладочные работы   | июл.16           | сен.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 3.7.     | <b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>   | окт.16           | дек.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 4        | Комплексное опробование оборудования   | окт.16           | дек.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 4.1.     | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 4.2.     | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 4.3.     | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  | не требуется     | не требуется     | не требуется                              | не требуется     | не требуется                                | не требуется                              |                               |   |
| 4.4.     | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету  | окт.16           | дек.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |
| 4.5.     | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.   | окт.16           | дек.16           | н.д.                                      | н.д.             | 100%  | 100%                                      |                               |   |

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

**МУП "Троицкая электросеть"**  
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**Ф 1.1.1.2016**  
(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.**  
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта

| №№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |                                    | Остаток                         |                                 | План (факт) года 2015 | Год 2016 |                                    | Год 2017 |                                    |      |                                    | Год 2018 |                                    |      |                                    | Год 2019 |                                    |      |                                    | Год 2020 |                                    |      |                                    | Итого за период реализации инвестиционной программы |                                    |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|----|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|    |   | План                             | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года 2015 | по состоянию на 01.01.года 2017 |                       | План     | Предложение по корректировке плана | План     | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План     | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План     | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План     | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План  | Предложение по корректировке плана |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|    |   |                                  |                                    |                                 |                                 |                       |          |                                    |          |                                    |      |                                    |          |                                    |      |                                    |          |                                    |      |                                    |          |                                    |      |                                    |   |                                    | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 1  | 2   | 3                                | 4                                  | 5                               | 6                               | 7                     | 8        | 9                                  | 10       | 11                                 | 12   | 13                                 | 14       | 15                                 | 16   | 17                                 | 18       | 19                                 | 20   | 21                                 | 22       | 23                                 | 24   | 25                                 | 26  | 27                                 | 28           | 29      | 30           | 31      | 32           | 33      | 34           | 35      | 36           | 37      | 38           | 39      | 40           | 41      | 42           | 43      | 44           | 45      | 46           | 47      | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1 |



Год раскрытия информации: 2017 год

**Паспорт инвестиционного проекта**

**МУП "Троицкая электросеть"**  
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**Ф 1.1.1.2016**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.**  
(наименование инвестиционного проекта)

**Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.**

|   |   |
|---|---|
| Наименование объекта  | ТП-501 РУ-10 кВ   |
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)   | г. Москва, г. Троицк  |
| Тип проекта   | реконструкция   |
| Вводимая мощность (в том числе прирост)   | н.д.  |
| Срок ввода объекта  | декабрь 2016 года   |
| Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату  | выполнено   |
| Сметная стоимость проекта в ценах _2015_ года с НДС, млн. руб.                                    | 1,268   |
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта                                   | локальная смета   |
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.                                     | 0,813   |
| Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.                                | 0,813   |
| в том числе   |   |
| - по договорам подряда (в разбивке по каждому подрячику и по договорам):                          |   |
| объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.                                   |   |
| % от сметной стоимости проекта  |   |
| оплачено по договору, млн. руб.   |   |
| освоено по договору, млн. руб.  |   |
| - по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): |   |
| объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.                                   | 0,813   |
| % от сметной стоимости проекта  |   |
| оплачено по договору, млн. руб.   | 0,813   |
| освоено по договору, млн. руб.  | 0,813   |
| - по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)                          |   |
| объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.                                   |   |
| % от сметной стоимости проекта  |   |
| оплачено по договору, млн. руб.   |   |
| освоено по договору, млн. руб.  |   |
| % заcontractованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками                     |   |
| в том числе   |   |
| - СМР, %  |   |
| - поставка основного оборудования, %  |   |
| - разработка проектной документации и рабочей документации, %                                     |   |
| % оплаты по объекту(предоплата)   |   |
| всего оплачено по объекту   |   |
| % освоения по объекту за отчетный период  |   |
| всего освоено по объекту  |   |
| Участники реализации инвестиционного проекта:   | ООО "Инженеренговая Проектно-Строительная компания "ТЭСК"         |
| - заказчик-застройщик   |   |
| - проектно-изыскательские организации   |   |
| - технические агенты  |   |
| - подрядчики  |   |
| - поставщики основного оборудования   |   |
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта                            | хозспособ   |
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта               |   |
| в том числе   |   |
| - строительный персонал   |   |
| - монтажный персонал  |   |
| Основное оборудование   | Ячейки 10 кВ КСО-393 - 10 шт. с выключателями нагрузки ВНА-10/630 |
| График поставки основного оборудования  |   |
| - дата поставки   |   |
| - задержки в поставке   | н.д.  |
| - причины задержек  | н.д.  |
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок                                   | Реализован в установленный срок                                   |
| Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:                          |   |
| - выявленные нарушения договоров подряда,   |   |
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,   |   |
| - предписания надзорных органов,  |   |
| - дефицит источников финансирования и др.,  |   |
| - другое (расшифровать)   | нет.  |
